Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

IZVEŠTAJ BR. 5
30.05.2022. -05.06.2022.

Јун 2022.

Kontrolni list

Naručilac:	Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor:	Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Projekat:	Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor:	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor br:	404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022. 1/2022-1/103 od 21.01.2022. PBU-21/22 od 21.01.2022.
Naslov dokumenta:	Nedeljni Izveštaj br. 5 - 30.05.-05.06.2022.
Broj dokumenta:	SEK3-N.IZV-005

	Pripremio	**Pregledao**	**Odobrio**
ORIGINAL	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
	Miloš Trajković	Jelena Simonović	Dragan Gligorov
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**
April 2022.			

REVIZIJA	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca i Investitora, u skladu sa uslovima imenovanja Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica.

Sadržaj

1 NEDELJNI IZVEŠTAJ 4

1.1 DEMONTAŽA 4
1.1.1 Demontaža kontaktne mreže 4
1.1.2 Demontaža SS i TK opreme 4
1.1.3 Demontaža gornjeg stroja pruge 4
1.2. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD-VRBAS 5
1.2.1 Radovi na donjem stroju 5
1.2.2 Radovi na gornjem stroju 9
1.2.3 Radovi na stanici Novi Sad/TPS Novi Sad (arhitektura i građevinski radovi) 10
1.2.4 Radovi na izradi temelja stubova kontaktne mreže 13
1.2.5 Radovi na hidrotehničkim instalacijama 13
1.2.6 Geodetski radovi 14
1.2.7 Radovi na termotehničkim instalacijama 24
1.2.8 Mostovi i inženjerske konstrukcije 25
1.2.9 Bezbednost i zdravlje na radu 28
1.3. RADOVI NA DEONICI VRBAS – NAUMOVIĆEVO 32
1.4. RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO – DRŽAVNA GRANICA 32

2 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA 33

3 SASTANCI 34

4 ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA 35

1 NEDELJNI IZVEŠTAJ

1.1 Izveštaj za period od 30.05.-05.06.2022.

1.1 DEMONTAŽA

1.1.1 Demontaža kontaktne mreže

Za period od 30.05. do 05.06.2022. godine nije bilo građevinskih radova (odnosno radova na demontaži).

1.1.2 Demontaža SS i TK opreme

Demontirano je i odveženo na lokaciju Investitora 30kom APB kućica i kućica Putnog prelaza od njih 57 ukupno:

- Za deonicu 1 ukupno 19kom zaključno sa ponedeljkom 6.6.2022
- Za deonicu 2 ukupno 11kom zaključno sa ponedeljkom 6.6.2022

Završena je polovina kolizije kod nadvošnjaka u Partizanskoj
U ponedeljak 6.6. počinju pripremni radovi za koliziju 1 i uvod kablova u staničnoj zgradi i za koliziju 4

1.1.3 Demontaža gornjeg stroja pruge

Radovi na gornjem stroju na deonici Novi Sad – Lovćenac (isključeno) vršeni su radovi na:

- Demontaža pragova na ukupno 2,24 km

Radovi na demontaži koloseka od km 78+481 do km 127+718, bez rasputnice Sajlovo i dela koloseka od km 111+900 do km 122+970 uključujući i satnicu Vrbas, su završeni.

.

1.2. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD-VRBAS

1.2.1 Radovi na donjem stroju

Aktuelnosti na gradilišt
1/ Građevinski radovi:
Deonica 1
Novi Sad - Vrbas

U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Stepanovićeva:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)
- U toku predhodne nedelje nije bilo radova na donjem stroju.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)
- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Širok iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Postavljanje geotekstila i geomreže.

Km 77+875 do km 78+525 Levi i desni kolosek i vezni kolosek br. 2

Km 80+850 do km 81+475 Levi i desni kolosek

Kolosek za Sombor km 0+375 do km 1+325

Kolosek za Sombor km 0+375 do km 1+325

Vezni kolosek br. 1 od km 1+150 do km 1+550

Sobzirom da nisu dobijeni zahtevani parametri nosivosti na posteljici od km 78+550 do km 78+575 (desni kolosek) urađena je probna deonica. Izvršena je zamena materijala šljunkom u sloju debljine d=30cm.
Prema dobijenim rezultatima i rezultatima na ranije sprovedenoj probnoj deonici od km 78+425 do km 78+525 sačinjen je zapisnik sa predlogom rešenja. Očekuje se da Izvođač pošalje predlog rešenja projektatu na saglasnost.

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Podtlo levog i desnog koloseka od km 81+325 do km 81+475.
- Podtlo koloseka za Sombor 0+925 do km 1+325.
- Posteljica koloseka za Sombor 0+825 do km 0+925.
- 1. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 81+050 do km 81+150.
- 2. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 81+025 do km 81+100.
- 2. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 80+950 do km 81+000.
- 1. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 81+150 do km 81+200.
- 3. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 80+850 do km 80+925.
- 1. sloj nasipa veznog koloseka br.1 od km 1+300 do km 1+350.
- 2. sloj nasipa veznog koloseka br.1 od km 1+150 do km 1+200.
- 1. sloj nasipa koloseka za Sombor 0+375 do km 0+400.

1. sloj nasipa veznog koloseka br.1 od km 1+375 do km 1+525

Deonica 2
Vrbas – Naumovićevo

Skidanje humusa I obrada podtla od km 128+849.48 do km142+682.79

Skidanje humusa i obrada podtla od km 128+849.48 do km142+682.79

Komentar nadzora:
Usled obilnih padavina Izvođač je upozoren da radove na obradi podtla vrši u skladu sa tehničkim uslovima
Materijal za izradu nasipa na ovoj deonici još uvek nije odobren od strane nadzora

Deonica 3

Naumovićevo – Subotica(Kelebija)

Izrada nasipa na km163+200 do km163+300

Izrada nasipa na km163+100 do km163+200

Komentar nadzora:
Radovi na ovoj deonici odvijaju se bez predhodno odobrenih materijala za nasip

1.2.2 Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom preiodu, osim radova na demontaži nije bilo drugih radova na gornjem stroju.

1.2.3 Radovi na stanici Novi Sad/TPS Novi Sad (arhitektura i građevinski radovi)

2/9.1.8- Peronski zidovi u Stanici Novi Sad

- Ugradnja armature, postavljanje oplate i betoniranje krune peronskog zida, peron 2,
- Ugradnja armature, postavljanje oplate i betoniranje krune peronskog zida, peron 3,
- Zatrpavanje potpornih zidova na peronu 2 i peronu 3

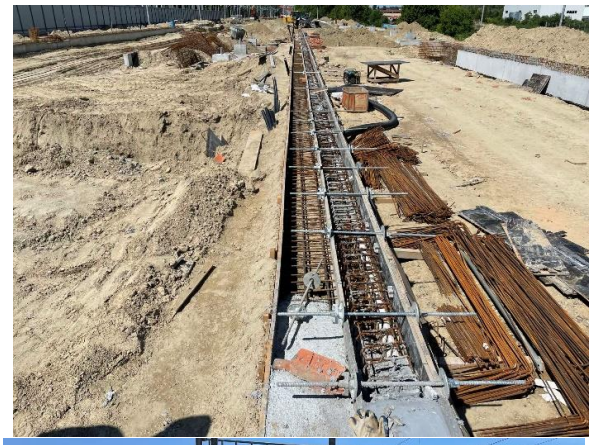
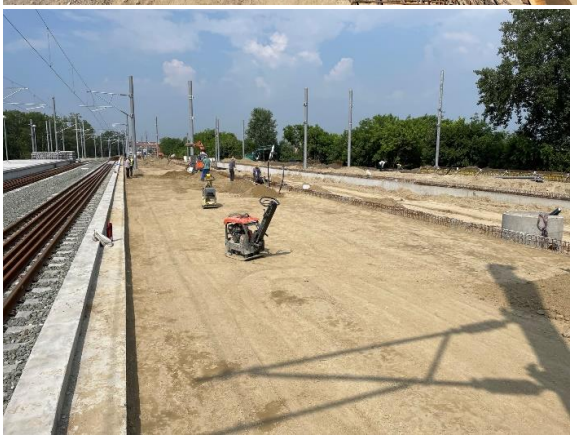
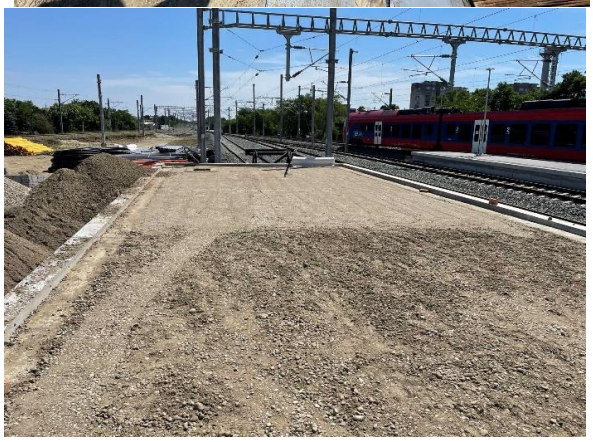

2/9.1.2- Betonska Konstrukcija dogradnje Pothodnika u Stanici Novi Sad

- Pripremni radovi na teretnom pothodniku
- Pripremni radovi na liftu pesackog pothodnika

2/9.1.3- Čelična konstrukcija peronske nadstrešnice

- Betoniranje prve faze temelja stubova nadstresnice

2/9.1.6- Betonska Konstrukcija Pothodnika u TPS Novi Sad

- Ugradnja armature, postavljanje oplate i betoniranje peronskog zida

Izrada telekomunikacionih šahtova u stanici Novi Sad

- priprema podloge telekomunikacionih sahtova, ugradnja armature i oplate

1.2.4 Radovi na izradi temelja stubova kontaktne mreže

- <u>Građevinski radovi:</u>

<u>Montaža stubova kontaktne mreže</u>

- Izvođač radova nije vršio montažu stubova

<u>Montaža portala</u>

- Izvođač radova nije vršio montažu portala

<u>Betoniranje temelja kontaktne mreže</u>

- Izvođač radova nije vršio betoniranje temelja

Napomena: U periodu od 28.05.2022. do 03.06.2022 izvođač radova nije vršio radove na izradi temelja stubova, sidara i portala kontaktne mreže.

- <u>Elektro radovi:</u>

U izveštajnom preiodu nije bilo radova.

1.2.5 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Izvođač planira da **nakon rušenja betonske konstrukcije nadvožnjaka do kote terena i radova na sečenju i blindiranju postojećeg toplovoda,**pristupi izmeštanju kanalizacije.
U toku je rušenje postojeće konstrukcije nadvožnjaka.

Na osnovu prethodno navedenih aktivnosti,Nadzorni inženjer za hidrotehničke instalacije zahteva od Izvođača **na uvid**:

- **situacioni plan izmeštanja kanalizacije u Partizanskoj ulici - za izvođenje**
- **podužni profil izmeštene kanalizacije u Partizanskoj ulici - za izvođenje**
- **metodologiju izvođenja radova na izmeštanju kanalizacije u Partizanskoj ulici na osnovu korigovanog predmera JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad**
- **dinamiku izvođenja radova na izmeštanju kanalizacije u Partizanskoj ulici na osnovu korigovanog predmera JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad**
- **da je Izvođač radova na izmeštanju kanalizacije u Partizanskoj ulici ovlašćen za tu vrstu radova od imaoca javnih ovlašćenja JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad**

Izvođač treba da Nadzornom inženjeru za hidrotehničke radove dostavi **zahtevanu dokumentaciju**, pre početka radova na izmeštanju kanalizacije u Partizanskoj ulici kao i da organizuje **zajednički sastanak** na terenu kojem bi prisustvovali **predstavnici Izvođača,operativnog nadzora imaoca javnih ovlašćenja JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica.**

1.2.6 Geodetski radovi

Deonica 1

- Geodetska kontrola anker ploče na nadstrešnicama 2-4 do 2-9, 3-3 do 3-5, 3-7 i 3-8, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g102: Anker ploče su u granicama dozvoljenih odstupanja na nadstrešnicama: 2-4 do 2-9 i 3-3 do 3-5; Anker ploče na nadstrešnicama 3-7 i 3-8 nisu u granicama dozvoljenih odstupanja

- Geodetska kontrola oplate temelja peronskog zida 4 kolosek br. 6 od km 77+139 do km 77+168.50 , broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g103: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola oplate krune peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 76+889 do km 76+938.50, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g104: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola PVC cevi između TKO4-TKO39-TKO40, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g105: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola podtla na stepenicama kolosek za Sombor od km 0+225 do km 0+325, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g040: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g037 - Pozicija nije spremna za kontrolu
- Broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g038 - Pozicija nije spremna za kontrolu
- Broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g039 - Pozicija nije spremna za kontrolu
- Geodetska mreža Deonica 2 od km 94+000 do km 112+000: Pregled dostavljene tehničke dokumentacije
- Novi Sad Tehničko putnička stanica stacionaža km 79+336 do km 79+38. Geodetska kontrola oplate temelja peronskog zida sa leve strane, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g106: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Novi Sad Tehničko putnička stanica stacionaža km 79+336 do km 79+38. Geodetska kontrola oplate temelja peronskog zida sa desne strane, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g107: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate temelja nadstrešnice: 2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g108: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

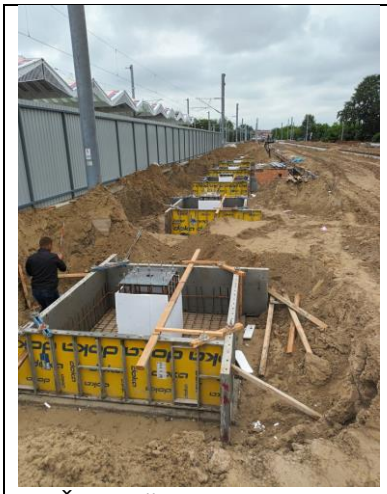

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate krune peronskog zida peron 3 kolosek 4: 76+925-76+975, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g109: Pozicija nije spremna za kontrolu.
- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate temelja TKO okna TKO45,TKO44 i TKO43, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g110: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate krune peronskog zida peron 2 kolosek 3: 76+866-76+897.5, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g111: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

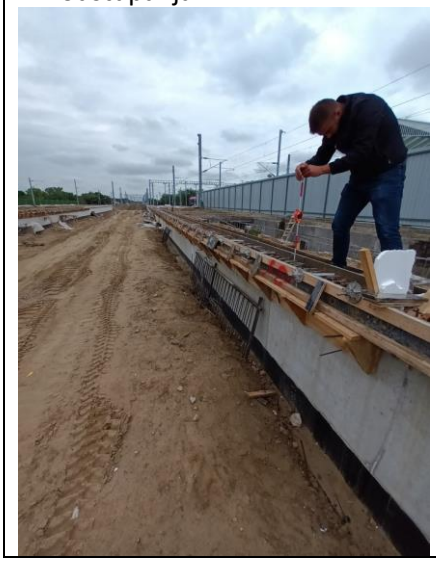

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate krune peronskog zida peron 3 kolosek 4: 76+872-76+926, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g112: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola zamene materijala od km 78+550 do km 78+575 desni kolosek – probna deonica, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g044: Probna deonica na koti -5cm od projektovane.

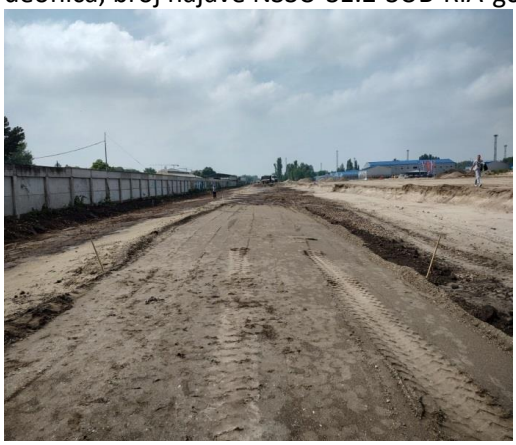

- Geodetska kontrola podtla na stepenicama od km 80+875 do km 80+900 levi i desni kolosek, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g045: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola posteljice od km 0+900 do km 1+225 kolosek za Sombor, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g048: Pozicija nije spremna za kontrolu.

- Geodetska kontrola posteljica od PR 35 km 0+850 to PR 54 km 1+325 - Kolosek za Sombor, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-048: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola podtla od PR 193 km 81+300 to PR 200 km 81+475 - Levi i desni kolosek, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-049: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola anker ploče nadstrešnice: 3-7, 3-8, 4-5, 4-6, 4-7, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g115: Anker ploča 4-7 je u granicama dozvoljenih odstupanja. Ostale anker ploče nisu u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida, peron 4 kolosek 6: 77+138.80 - 77+168.50, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g113: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola posteljice od PR 33 km 0+800 to PR 35 km 0+850 -Kolosek za Sombor, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-052: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola anker ploča nadstrešnice 2-1, 2- 2 i 2-3 na peronu 2, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g116: Anker ploče su u granicama dozvoljenih odstupanja.

- TPS Novi Sad. Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida, leva strana: 79+336 до km 79+381, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g117: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola posteljice od PR 27 km 0+650 to PR 33 km 0+800 -Kolosek za Sombor, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-052-R1: Pozicija nije spremna za kontrolu.

Deonica 2

- Prelged projektne knjige 2.2., priprema terenskih podataka: Datum - 30.05.2022. Nije bilo izlaska na teren zbog loseg vremena
- Pregled dokumentacije vezane za eksproprijaciju, kalibracija nivelira pred merenje sledeceg dana: Datum - 31.05.2022. Nije bilo izlaska na teren zbog loseg vremena
- Obilazak geodetske mreze pruge u Kelebiji: Datum - 25.05.2022. Napravljen plan merenja sa Izvodjacem radova, sugerisano da se koriste izvesne metode rada.

- Merenje vektora statickom metodom, nivelanje geodetske mreze pruge u saradnji sa Izvodjacem: Datum - 26.05.2022. Terenska merenja izvedena po dogovoru u pogledu tacnosti I potrenog broja vektora. Nivelmanski vlak zatvoren sa zadovoljavajucom tacnoscu.

- RIA za km 170 I 172, 2 nadvoznjaka: Datum - 27.05.2022. Obe RIE odobrene sa komentarom, stacionaze u zapisnicima I izvedeni radovi na terenu se nisu poklapali u potpunosti, u komentaru je navedeno sta je primljeno od trase.

Deonica 3

- 30.05.2022. - Usled nepovoljnih vremenskih uslova sve RIE su otkazane pa se radilo na pregledu projektne dokumentacije, knjiga 2.2
- 31.05.2022. - Pregled projektne dokumentacije, tačnije projekta eksproprijacije od Žednika (km157) do Subotice
- 01.06.2022. - Obilazak geodetske mreže u graničnom pojasu, pravljenje plana merenja za uklapanje koloseka. Na terenu rekognoscirana mreža, napravljen plan merenja GPS vektora, ustanovljena optimalna trasa za nivelanje operativnog poligona
- 02.06.2022. - U graničnom pojasu obavljena GPS merenja vektora, kao i nivelanje operativnog poligona u saradnji sa mađarskim geodetama. GPS statička merenja obavljena sa 6 antena istovremeno uz potrebna vremenska preklapanja, nivelanje poligona usklađeno sa mađarskom stranom, Nadzor je dobio sve potrebne podatke od susednih geodeta.

- 03.06.2022. - Obilazak gradilišta. Nadzor obisao gradilišta na 142. km, 132. km i 129. km. Nije bilo RIA zbog kiše koja je padala prethodnih dana.

Silos u Žedniku, km 156

1.2.7 Radovi na termotehničkim instalacijama

- Projekat zamene cevi vrelovoda JKP "Novosadska toplana" – Partizanska ulica Novi Sad.
  - PZI nije urađen već samo uslovi koji su dati od strane JKP "Novosadska toplana" isituacija vrelovoda;
  - Izvođač treba da dostavi Tehnologiju izmeštanja svih instalacija, od izabranog podizvođača, Nadzoru na saglasnost. Radove oko vrelovoda treba izvesti u saradnji sa NS Toplanom, a u skladu sa instrukcijama koje su ranije dostavljene

- Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Novi Sad
  - PZI još nije dostavljen na pregled od strane stručnog nadzora;
  - U prostoriji A0.19 se izvode unutrašnji građevinski radovi i potrebno je stari sistem ventilacije ukloniti i postojeće otvore zatvoriti – na osnovu usmene saglasnosti projektanta;
  - U prostoriji A0.20 potrebno je ukloniti postojeći cevni razvod grejanja, uključujući i grejna tela, ali je stopirano dok se ne dostavi i odobri predmetni PZI




- Produžetci, izmeštanje i ukidanje delova distributivne gasne mreže - Subotica - gasovod prečnika PE ø250mm i ø400mm
  - PZI je dostavljen Nadzoru i u fazi je pregleda
  - 30.05. Izlazak na teren sa predstavnicima Suboticegas-a, CRIC i predstavnika grada Subotice a u vezi sa problemima postojećeg gasovoda u Lošinjskoj i Bajnatskoj ulici;
  - 02.06. Suboticagas je izvršila šlicovanje gasovoda Ø400 mm, sa desne strane pruge, u okviru buduće zone podvožnjaka u Bajnatskoj;
  - Od Izvođača je zahtevano da hitno urade method statement kako bi smo mogli da ocenimo uticaj postojećeg gasovoda na građevinske radove. Ovo se odnosi i za lokaciju u Lošinjskoj i u Bajnatskoj ulici;
  - Suboticagas će razmotriti tehničko rešenje oko ukidanja gasovoda, koji je ispod samog mosta u Lošinjskoj ulici, i da predlože novo ukrštanje sa prugom kako bi se industrijski korisnici (pored Pionira ima još 1-2 potrošača) neometano snabdevali gasom;

1.2.8 Mostovi i inženjerske konstrukcije

PODVOZNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- Uklonjen je objekat „Staklara
- Izvode se radovi na rušenju starog mosta (1. faza)

Napomena:
Dana 03.06.2022. održan sastanak na terenu u prisustvu predstavnika Finansijera, Izvođača, Podizvođača i Nadzora.
Dogovorena preliminarna dinamika izvođenja radova i pozicija probnog šipa.
Izvođač je u obavezi da dostavi Nadzoru situacioni plan sa ucrtanim trasama instalacija i koordinatama probnog šipa na odobrenje.

IZVEŠTAJ SA OBILASKA POGONA ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE PORTALA KONTAKTNE MREŽE

- Izvršen je obilazak pogona „Amiga, doo“ u Kraljevu gde se izrađuju čelične konstrukcija portala kontakne mreže.
- Obilazak pogona izvršio je tim nadzora u sastavu: Branislav Dašić, Ivan Babić i Milena Čučković

- Na licu mesta konstatovano je sledeće:
  - Nakon vizuelnog pregleda prikazanih čeličnih konstrukcija Nadzor je izneo primedbe na izradu konstrukcije i naglasio da iste moraju biti korigovane do poziva na prijem konstrukcije
  - Izvođač (Podizvođač) je pre prijema konstrukcije dostavio nepotpunu tehničku dokumentaciju
  - Primedbe na prethodno dostavljenu dokumentaciju Nadzor je dostavio Dopisom br: NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-0083 od 01.06.2022.
  - Izvođač je u obavezi da pre poziva na prijem konstrukcije dostavi *Zahtev za odobrenje materijala* (MAR) i nakon dobijenog odobrenja da dostavi *Zahtev za fabrički prijem konstrukcije* (FAT).
  - Imajući u vidu dinamiku izvođenja radova, dogovoreno je da Izvođač u najkraćem roku dopuni dokumentaciju i ponovo pošalje na saglasnost Nadzoru kako bi se stekli uslovi za fabrički prijem konstrukcije.
  - Nadzor je napomenuo Izvođaču da pre montaže čelične konstrukcije portala Izvođač je u obavezi da dostavi Nadzoru Tehnologiju montaže na saglasnost.

Prilog fotografije:

1.2.9 Bezbednost i zdravlje na radu

Na gradilištu se izvode radovi uklanjanja stare pruge na deonicama Rumenka – Zmajevo i Žednik – Bačka Topola, radovi na pripremi tla u Novom Sadu i Žedniku, armiračko betonjerski radovi u stanici Novi Sad, priprema za radove unutar stanice Novi Sad kao i radovi na rekonstrukciji podvožnjaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu.
Mere bezbednosti i zdravlja na radu se poštuju, lična i kolektivna zaštitna sredstva obezbeđena.
Zone gradilišta nisu obezbeđene od pristupa neovlašćenih lica. Izuzetak su radovi na rekonstrukciji podvožnjaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu gde je gradilište kompletno ograđeno i uvedeno fizičko tehničko obezbeđenje. Podizvođači glavnog izvođača još uvek nisu ispunili obavezu dostavljanja dokumentacije Bezbednosti i zdravlja na radu. Situacija se polako popravlja a jedini problem su podizvođači podizvođača . Glavni izvođač radova ima kompletnu dokumentaciju.
Upućene su pismene instrukcije glavnom izvođaču radova u cilju poboljšanja mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Spisak podizvođača sa stanjem dokumentacije Bezbednosti i zdravlja na radu je dat u sledećoj tabeli. Tabela je ažurna sa datumom izrade nedeljnog izveštaja.

Tabela: Pregled stanja dokumentacije podizvođača

PODIZVOĐAČ	Stanje dokumentacije
JV CCECC&CR11G, BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
IKA-PEK DOO BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION CO. LTD. BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
STARTING DOO BEOGRAD, BATAJNICA	Dostavljena celokupna dokumentacija
GAT NOVI SAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
INGRAP-OMNI VALJEVO	Dostavljena celokupna dokumentacija
OBW BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
HIDRO MONT TEMERIN	Nije dostavljena dokumentacija
ALEK MONT PLUS DOO LEŠNICA	
DEKO TIM DOO BEŠKA	
RP MONT LINE BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
MILOŠ TRANSKOP BELEGIŠ	Nije dostavljena dokumentacija
D.O.O. KARIN KOMERC MD NOVI SAD	Dostavljena celokupna dokumentacija

DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO	Dostavljen deo obavezne dokumentacije: -prijava gradilišta -rešenje o licu BZR -Elaborat o uređenju gradilišta -Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR - Obrasci broj 6 - podaci o opremi za rad – stručni nalazi - dokaz o osposobljenosti rukovaoca - Izveštaji o lekarskim pregledima
TRIANGLA AB NOVI SAD	Dostavljen deo obavezne dokumentacije: -prijava gradilišta - Akt o proceni rizika - rešenje o licu BZR -Elaborat o uređenju gradilišta -Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR - Obrasci broj 6 - podaci o opremi za rad – stručni nalazi - dokaz o osposobljenosti rukovaoca
D.O.O. EXTRA AUTO TRANSPORT	Dostavljen deo obavezne dokumentacije : - prijava gradilišta -Elaborat o uređenju gradilišta - podaci o licu za BZR - Akt o proceni rizika - obrasci broj 6 - izveštaj o lekarskim pregledima - Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR -podaci o opremi za ličnu zaštitu
ZGOP a.d. NOVI SAD	**Dostavljena celokupna dokumentacija**
NORTH GATE CONTAINER TERMINAL DOO SUBOTICA	Dostavljen deo obavezne dokumentacije:: -prijava gradilišta -Elaborat o uređenju gradilišta -akt o proceni rizika - podaci o licu za BZR - izveštaj o lekarskim pregledima - Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR -podaci o opremi za ličnu zaštitu - dokaz o osposobljenosti rukovaoca
GORAN ERAK PR AUTOPREVOZNIK TEMERIN	**Dostavljena celokupna dokumentacija**
ŠUŠA DOO VETERNIK	**Dostavljena celokupna dokumentacija**
LHR DOO BEOGRAD	**Dostavljena celokupna dokumentacija**

LEMON DOO LAĆARAK	Dostavljen deo obavezne dokumentacije: -prijava gradilišta - podaci o licu za BZR - akt o proceni rizika - obrasci broj 6 - izveštaji o lekarskim pregledima - podaci o opremi za ličnu zaštitu - podaci o opremi za rad(stručni nalazi) - dokaz o osposobljenosti rukovaoca opremom - Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR
BIN-ING DOO BEOGRAD	Dostavljen deo obavezne dokumentacije: -prijava gradilišta -Elaborat o uređenju gradilišta
BALKAN TIM KOP D.O.O. BEOGRAD	**Nije dostavljena dokumentacija**

Slike sa obilaska gradilišta

Stanica Novi Sad

Stanica Novi Sad – stolarska radionica

Novi Sad – okolina Ranžirne stanice

Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu

Žednik

Mali Iđoš

Naumovićevo

Otvorena pruga deonica Bačka Topola – Mali Beograd

1.3. RADOVI NA DEONICI VRBAS – NAUMOVIĆEVO

1.4. RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO – DRŽAVNA GRANICA

2 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA

Пројекат: Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), Датум: 06.06.2022.

Статус пројектне документације - ПЗИ

Достављено пројеката
ИЖС: 115 пројеката
НАДЗОР: 678 пројеката
Укупно достављено пројеката: **793 пројеката**

Статус одобрених пројеката ИЖС: Одобрено 101 пројеката

Достављено Пројекти од старне Извођача Надзору					
Начин дотсављања	**Датум достављања**	**Број достављених пројеката**	**Основни пројекти**	**Ревизије пројеката**	**Корекције**
Ранији дописи		115	115	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020			7		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001			3		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002			1		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004	09.02.2022.	26	26	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005	02.03.2022.	31	28	0	3
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006	08.03.2022.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007	13.03.2022.	9	9	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009	16.03.2022.	2	2	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010	17.03.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011	25.03.2022.	4	4	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013	08.03.2022.	64	60	0	4
допис ЦИП 250-545/20	11.04.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014	20.04.2022.	371	369	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019	17.05.2022.	10	0	9	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020	19.05.2022.	131	131	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0022	25.05.2022.	40	32	7	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0025	02.06.2022.	23	13	10	0
Пројекти добијени маилом		8	3	5	0
УКУПНО:		**846**	**793**	**40**	**13**
Достављено до 15.02.2022.		**115**	**115**	**0**	**0**
Достављено од 15.02.2022.		**731**	**678**	**40**	**13**

	Статус Извештаја Надзора			
	А	**Б**	**Ц**	**Укупно**
Пројекти предати до 15.02.2022. (ИЖС)	**101**	**0**	**0**	**101**
Пројекти предати од 15.02.2022.	**113**	**243**	**23**	**379**
Пројекти друмских саобраћајница	**0**	**15**	**0**	**15**
Укупно прегледано од стране Надзора:	**113**	**258**	**23**	**394**
Укупно прегледано	**214**	**258**	**23**	**495**
Укупно прегледано ревизија пројеката:				**23**

Квалификација Извештаја
А - ПЗИ пројекат се прихвата
Б - ПЗИ пројекат се прихвата са коментарима
Ц - ПЗИ пројекат се одбија

3 SASTANCI

Predgled sastanaka sa Izvođačem/Investitorom/Naručiocem u izveštajnom periodu

Tema sastanka	Lokacija/Učesnici	Održan
Redovni koordinacioni sastanak (QA/QC, status radova, status dokumentacije, status materijala)	IŽS/Investitor, Finansijer, Nadzor, Izvođač	31.06.2022.
Redovni koordinacioni sastanak (IŽS)	IŽS/Investitor, Finansijer, Nadzor, Izvođač	01.06.2022.
Elektroradovi	Kamp NS/Investitor, Nadzor, Izvođač	02.06.2022.
Usaglašavanje PZI za daljinsko upravljanje SPEV	IŽS/Investitor, Finansijer, Nadzor, Izvođač	03.06.2022.

4 ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA

TABELAR REVIEW OF MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR) -STR
TABELARNI PRIKAZ ZAHTEVA ZA ODOBRENJE MATARIJALA - STR

Br.	Deonica	Datum prijema	Materijal:	Napomena	Korišćenje materijala:	Status	Dostavljeno:	Datum dostavljanj	PZI
NSSU-S2-STR-MAR-001	VB		Armaturni čelik-šipke prečnika 8-32 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o		Armatura HW šipova i armirački radovi -nadvožnjak na km 152+282,46	Odobreno	Petar Lopušina, Dragan Arsić		PZI Knjiga 2.1.1.36, pozicije 2.1.1.36.1.2 and 2.1.1.36.4.1
NSSU-S2-STR-MAR-002	VB		Betonski čelik-kotur prečnika 8-16 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o		Armatura HW šipova i armirački radovi -nadvožnjak na km 152+282,46	Odobreno	Petar Lopušina, Dragan Arsić		PZI Knjiga 2.1.1.36, pozicije 2.1.1.36.1.2 and 2.1.1.36.4.1
NSSU-S2-STR-MAR-0003	VB		Armaturni čelik-šipke prečnika 8-32 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	Potpisano od strane izvođača	Armatura HW šipova i armirački radovi nadvožnjak na km 142+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56	Odobreno	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI Knjiga 2.1.1.33.6.3-05.1, Knjiga 2.1.1.44, pozicija 2.1.1.44.6.3.-05.1, PZI Knjiga 2.1.1.45.6.3.-05.1, PZI Knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-05.1
NSSU-S2-STR-MAR-0004	VB		Betonski čelik-kotur prečnika 8-16 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	Potpisano od strane izvođača	Armatura HW šipova i armirački radovi nadvožnjak na km 142+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56	Odobreno	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI Knjiga 2.1.1.33.6.3-05.1, Knjiga 2.1.1.44, pozicija 2.1.1.44.6.3.-05.1, PZI Knjiga 2.1.1.45.6.3.-05.1, PZI Knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-05.1
NSSU-S2-STR-MAR-0005	VB		PVC hodroizolaciona membrana Mapeplan TU 20 Proizvođača Polyglass S.p.A Italia	Potpisano od strane izvođača	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI Knjiga 2.1.1.32, pozicija 2.1.1.32.6.3.-06.1., PZI Knjiga 2.1.1.33, pozicija 2.1.1..33.6.3.-06.1, PZI Knjiga 2.1.1.44., pozicija 2.1.1.44.6.3.-06.1, PZI Knjiga 2.1.1.45, pozicija 2.1.1.45.6.3.-06.1, PZI Knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-06.1
NSSU-S2-STR-MAR-0006	VB		PVC hodroizolaciona membrana SikaplanWP 1100-20HL ,Proizvođač Sika Services Ag,Švajcarska	Potpisano od strane izvođača	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI knjiga 2.1.32, pozicija 2.1.1.32.6.3-06.1, PZI knjiga 2.1.33., pozicija 2.1.133.6.3.-06.1, PZI knjiga 2.1.1.44.6.3.-06.1, PZI knjiga 2.1..145, pozicija 2.1.1.45.6.3-06.1, PZI knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3-06.1
NSSU-S2-STR-MAR-0007	VB		Netkani geotekstil 500g/m2 Edilfon FR 500,PROIZVOĐAČA Manifattura Fontana,Italija	Potpisano od strane izvođača	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		Projekat konstrukcija, Tehnički uslovi, Knjiga 2.1.1.0, pozicija 2.1.1.0-06.02
NSSU-S2-STR-MAR-0008	VB		Hidro-ekspandirajuća bentonintna traka Idostrop B25 proizvođača Mapei S.p.A Italija	Potpisano od strane izvođača	Obezbeđenje vodonepropusnosti spoja na prekidima betoniranja ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI knjiga 2.1.1.32, pozicija 2.1.1.32.6.3.-08.6, PZI knjiga 2.1.1.33, pozicija 2.1.1.33.6.3-08.6, PZI knjiga 2.1.1.44, pozicija 2.1.1.44.6.3-08,6, PZI knjiga 2.1.1.45, pozicija 2.1.1.45.6.3-08.6, PZI knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-08.6
NSSU-S2-STR-MAR-0009	VB		Vodonepropusne Fungeband trake 320WB I STR B 320 proizvođača Mapei S.p.A Italija	Potpisano od strane izvođača	Zaptivanje spoja dva betonska elementa 0 cm ,dilatacije 2 cm ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI knjiga 2.1.1.32, pozicija 2.1.1.32.6.3.-08.05, PZI knjiga 2.1.1.33, pozicija 2.1.1.33.6.3.-08.5, PZI knjiga 2.1.1.44, pozicija 2.1.1.44.6.3-08.5, PZI knjiga 2.1.1.45, pozicija 2.1.1.45.6.3-08.5, PZI knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-08.5
NSSU-S2-STR-MAR-0010	VB		Vodonepropusne Fungeband trake Waterbar D-32i Waterbar DF-32 ,Proizvođač Sika Services Ag,Švajcarska	Potpisano od strane izvođača	Zaptivanje spoja dva betonska elementa 0 cm ,dilatacije 2 cm ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Odobreno uz komentar	Dragan Arsić,Petar Lopušina, Mitrović Branko		PZI knjiga 2.1.1.32, pozicija 2.1.1.32.6.3.-08.5, PZI knjiga 2.1.1.33, pozicija 2.1.1.33.6.3.-08.5, PZI knjiga 2.1.44, pozicija 2.1.1.44.6.3.-08.5, PZI knjiga 2.1.1.45, pozicija 2.1.1.45.6.3.-08.5, PZI knjiga 2.1.1.46, pozicija 2.1.1.46.6.3.-08.5

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica
TABELAR REVIEW OF MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR) -SUB
TABELARNI PRIKAZ ZAHTEVA ZA ODOBRENJE MATARIJALA -SUB

Br.	Deonica	Datum prijema	Materijal:	Napomena	Korišćenje materijala:	Status	Dostavljeno:	Datum dostavljanja	PZI
NSSU-S2-SUB-MAR-001	VB		Geocomposit TenCate Rock PEC 95/95 L proizvođača TenCate Geosynthetics Austria GmbH		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja umesto geotekstila i geomreže	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/2.4.2, 2/2.4.3, 2/2.4.4, pozicije 2/2.02.13-1 i 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-002	VB		Geotekstil GEO PP AG 350 proizvođača Geo&Tex 2000 S.p.A		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-003	VB		Geotekstil GEO PP AG 370 proizvođača Geo&Tex 2000 S.p.A		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-004	VB		Geotekstil GEODREN PPST 350, proizvođača EDILFLOOR		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-005	VB		Geotekstil BS30, proizvođača BontexGeo Kft		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-006	VB	31.05.2022.	Geotekstil MACTEX H 70.1, proizvođača MACCAFERRI		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-007	VB		Geotekstil MACTEX H4500,proizvođača MACCAFERI		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-008	VB		Geotekstil SNW - Superior - S30NW, proizvođača THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-009	VB		Geotekstil TNT PP 300 - T, proizvođača MACCAFERRI,		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 01.01.03.11	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11
NSSU-S2-SUB-MAR-010	VB		Geotekstil MACTEX H 60.1, proizvođača MACCAFERRI,		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11
NSSU-S2-SUB-MAR-011	VB		Geotextile TECNODREN PP/N 300, proizvođača Ovattificio Alpino S.R.L.		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 01.01.03.11	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11
NSSU-S2-SUB-MAR-012	VB		Geotekstil Tipptex BS25, proizvođača BontexGeo Kft		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11
NSSU-S2-SUB-MAR-013	VB		Geotekstil GEODREN A7, proizvođača EDILFLOOR S.p.A		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 01.01.03.11	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11

NSSU-S2-SUB-MAR-014	VB		Geotekstil S25NW,proizvođača THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A.		Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 01.01.03.11	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/3.1.31.1; 2/3.1.32.1, pozicije 01.01.03.11
NSSU-S2-SUB-MAR-015	VB		GEOMREŽA - TX160, proizvođača TENSAR		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odobreno	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-016	VB		GEOMREŽA - EnkaGrid MAX 30, proizvođača ENKA SOLUTIONS		Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-2B	Dragan Ilić , Marjan Jerbić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4.7, 2/2.5.1, 2/2.5.2, 2/2.5.3 i 2/2.5.4, pozicije 2/2.02.13-2B
NSSU-S1-SUB-MAR-01	01		EKO IMPREGNIR MK	Nije potpisao izvođač	Zaštita mermernih ploča	Odobreno	Marina Gavrilović, Dejan Todorović		
NSSU-S1-SUB-MAR-02	01		SikaLastic 200W-RS	Nije potpisao izvođač	Hidroizolacija poda	Odobreno	Marina Gavrilović, Dejan Todorović		
NSSU-S2-SUB-MAR-020	02		Koherentni materijal za izradu nasipa pruge, prašinast pesak, iz pozajmišta materijala (izvorišta), koje nije na spisku predloženih pozajmišta u projektnoj dokumentaciji, na lokaciji KP 4156, KO Mali Iđoš		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja	Razmatra se	Marjan Jerbić, Ivica Vasić,Bojana Ćosić,Aleksandar Branković		
NSSU-S2-SUB-MAR-021	VB	24.05.2022.	GEOMREŽA - TX160 TENSAR, proizvođača Tensar International Limited, Blackburn BB1 2QX, United Kingdom		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja, geomreža	Odobreno	Marjan Jerbić, Ivica Vasić,Bojana Ćosić,Aleksandar Branković	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/2.4.2, 2/2.4.3, 2/2.4.4, pozicija 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-022	VB	24.05.2022.	Tipptex BS 12W netkani geotextil 150gr/m², proizvođača Bontexgeo Kft, Huszár Andor ut 5, 3580 Tiszaújváros, Mađarska		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja, geotekstil	Odbijeno,Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-1	Marjan Jerbić, Ivica Vasić,Bojana Ćosić,Aleksandar Branković	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige:2/2.4.2, 2/2.4.3, 2/2.4.4, pozicija 2/2.02.13-1
NSSU-S2-SUB-MAR-018	02		Pesak sa pozajmista Kelebija ,dobavljač VOJPUT doo,Subotica	Potpisano od strane izvođača	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se	M.Jerbić,B.Ćosić,G.Kostić,Ivica Vesić		
NSSU-S2-SUB-MAR-027	VB		Geotekstil GEO PP AG 330 , proizvođača Geo&Tex 2000 S.p.A	Potpisano od strane izvođača	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta - nadvoznjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 01.01.03.11	M.Jerbić,B.Ćosić,G.Kostić,Ivica Vesić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4, 2/2.5, pozicije pos 2/2.02.13-2B
NSSU-S1.2-SUB-MAR-001	Novi Sad-Lovćenac		NAUE GEOTEXTILE SECUTEX 401 GRK 5C		Donji stroj pruge, geotekstil	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-002	Novi Sad-Lovćenac		Tipptex BS 30		Donji stroj pruge, geotekstil	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-003	Novi Sad-Lovćenac		Geotextile S30NW		Donji stroj pruge, geotekstil	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-004	Novi Sad-Lovćenac		Geotextile TECNODREN PP N 400		Donji stroj pruge, geotekstil	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-005	Novi Sad-Lovćenac		NAUE GEOGRID SECUGRID 40/40 Q1		Donji stroj pruge - geomreža	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-006	Novi Sad-Lovćenac		Enka Grid MAX 40		Donji stroj pruge - geomreža	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-007	Novi Sad-Lovćenac		MIRAGRID GX GEOGRIDS		Donji stroj pruge - geomreža	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-008	Novi Sad-Lovćenac		NAUE GEOCOMPOSITE COMBIGRID PP 40/40 Q1 GRK 4C		Donji stroj pruge, umesto geotekstila i geomreže	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-009	Novi Sad-Lovćenac		GEOCOMPOSITE 'Tencate ROCK PEC 100 / 100		Donji stroj pruge, umesto geotekstila i geomreže	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-010	Novi Sad-Lovćenac		PRELAZNI SLOJ		Donji stroj pruge, prelazni sloj	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-011	Novi Sad-Lovćenac		ZASTITNI SLOJ		Donji stroj pruge, zastitni sloj	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S1.2-SUB-MAR-012	Novi Sad-Lovćenac		NASIP		Donji stroj pruge, materijal za izradu nasipa	Razmatra se	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić		
NSSU-S2-SUB-MAR-023	VB	26.05.2022.	Geomreža MACGRID WG4S, proizvođača MACCAFERI, Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italija		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja	Odbijeno,Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-2B	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4, 2/2.5, pozicije pos 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-024	VB	26.05.2022.	Geomreža GRID PET40, proizvođača HUESKER Synthetic GmbH, Fabrička ulica 13-15 48712 Gescher, Nemačka		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz Tehničkih specifikacija poglavlje 2/2.02.13-2B	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4, 2/2.5, pozicije pos 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-025	VB	26.05.2022.	Geomreža SECUGRID 40/40 Q1, proizvođačaNAUE GmbH & Co. KG Gewerbestr. 2, 32339 Espelkamp, Nemačka		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4, 2/2.5, pozicije pos 2/2.02.13-2B
NSSU-S2-SUB-MAR-026	VB	26.05.2022.	GeomrežaEDILGRID K 30/30, proizvođača EDILFLOOR S.P.A, via Leonardo da Vinci, 15 - 36066 Sandrigo (Vi) - Italija		Trasa pruge i stanice - izgradnja donjeg stroja	Odbijeno, Materijal nije u skladu sa zahtevima iz	M.Jerbić,,G.Kostić,D.Ilić	02.06.2022.	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.4, 2/2.5, pozicije pos 2/2.02.13-2B

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

Br.	Deonica	Datum prijema	Materijal:	Napomena	Korišćenje materijala:	Status	Dostavljeno:	Datum dostavljanja	PZI
NSSU-S1-ARC-MAR-03	1		AQUABOND Adhesion primer, DIATHONITE DEUMIX +		Termomalter	Razmatra se	Marina Gavrilović		
